

POP – Execução de Testes EO (Engineering Order) e PQ (Pilot Production)

Sumário

1. Objetivo	2
2. Escopo	2
3. Conceitos-chave	2
4. Estrutura do Processo	3
5. Procedimento – EO (Engineering Order).....	3
5.1 Solicitação e Análise de Viabilidade	3
5.2 Preparação do Teste	3
5.3 Materiais e Planejamento	3
5.4 Alinhamento Interno	4
5.5 Execução do EO	4
5.6 Registro e Resultado	4
6. Procedimento – PQ (Pilot Production).....	4
6.1 Início.....	4
6.2 Preparação	4
6.3 Execução	4
6.4 Avaliação e Fechamento	5
7. Pontos de Controle (Checkpoints)	5
Antes do EO:.....	5
Antes da execução:	5
Após EO:	5
Antes do PQ:	5
Após PQ:	5
8. Observações Importantes	5

1. Objetivo

Padronizar o processo de planejamento, execução e avaliação de testes industriais (EO) e produção piloto (PQ), garantindo alinhamento entre as áreas envolvidas, rastreabilidade das decisões e cumprimento dos critérios definidos pela Wella.

2. Escopo

Este procedimento se aplica a:

Testes industriais relacionados a:

1. Novos materiais de embalagem (ME);
2. Novas matérias-primas (MP);
3. Alterações de formulação ou composição.

Execução de:

1. EO (Engineering Order);
2. PQ (Pilot Production).

Abrange as áreas:

1. Engenharia / Projetos (Savoy);
2. Produção;
3. Qualidade;
4. Manutenção;
5. Finanças;
6. Interface com Wella.

3. Conceitos-chave

1. EO (Engineering Order)

Teste industrial com objetivo de validar a viabilidade técnica de novos materiais ou mudanças de processo.

Características:

- Sempre solicitado pela Wella;
- Possui protocolo com critérios de sucesso;
- Produto resultante é não vendável;
- Produto é obrigatoriamente descartado.

2. PQ (Pilot Production)

Primeira produção sob condições reais.


Características:

- Executado após aprovação do EO (quando aplicável);
- Produto potencialmente vendável;
- Pode ser descartado caso apresente desvios.

4. Estrutura do Processo

Conforme apresentado na Figura 1, o escopo deste POP abrange os subprocessos destacados em azul, correspondentes às etapas de Desenvolvimento e Testes e Manufatura (Piloto). Nessas etapas ocorrem as atividades de EO e PQ, fundamentais para validação industrial, avaliação de desempenho do processo e liberação das condições necessárias para continuidade do fluxo do projeto.

Figura 1 – Macrofluxo de Projetos Wella

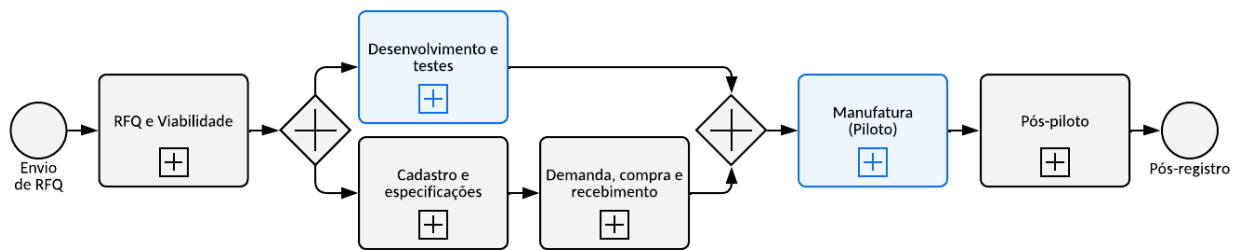

5. Procedimento – EO (Engineering Order)

5.1 Solicitação e Análise de Viabilidade

1. Wella solicita realização do teste (EO);
2. Wella envia comunicação inicial avaliando factibilidade;
3. Savoy avalia e responde considerando:
 - o Capacidade produtiva;
 - o Impactos técnicos;
 - o Necessidades de materiais.

5.2 Preparação do Teste

1. Wella envia protocolo de EO, contendo:
 - a. Critérios de sucesso (ex: velocidade, temperatura, performance);
 - b. Tempo mínimo de operação contínua;
 - c. Critérios de avaliação de qualidade.
2. Engenharia realiza cotação do teste, com base em:
 - a. Produto similar;
 - b. Quantidade de amostras;
3. Finanças valida a cotação.
4. Wella aprova ou solicita ajustes.

5.3 Materiais e Planejamento

1. Wella providencia ou define envio de materiais;
2. Recebimento e conferência de materiais;

3. Agendamento do teste (preferencialmente após disponibilidade dos materiais).

5.4 Alinhamento Interno

1. Realizar reunião de alinhamento antes da execução.

Participantes obrigatórios:

- Dono do projeto;
- Produção;
- Manutenção;
- Qualidade.

5.5 Execução do EO

1. Executar o teste conforme protocolo Wella;
2. Monitorar os critérios definidos.

5.6 Registro e Resultado

1. Registrar os resultados conforme protocolo.

Possíveis cenários:

- Se reprovado:
 - Projeto pode ser encerrado;
 - Ou pode ser solicitada nova rodada de teste.
- Se aprovado:
 - Seguir para execução de PQ.

⚠ Importante: todo material do EO deve ser descartado, independentemente do resultado.

6. Procedimento – PQ (Pilot Production)

6.1 Início

Wella envia protocolo de PQ.

6.2 Preparação

1. Garantir:
 - Cadastro técnico completo;
 - Disponibilidade de materiais;
 - Planejamento dentro do supply program.
2. Materiais seguem fluxo padrão:
 - Podem ser fornecidos pela Wella ou adquiridos pela Savoy.

6.3 Execução

1. Agendamento do piloto;
2. Execução da produção piloto.

6.4 Avaliação e Fechamento

1. Avaliar desempenho do processo e qualidade;
2. Preencher relatório de PQ.

Possíveis cenários:

- Se produto aprovado → pode ser disponibilizado para venda;
- Se produto com desvio → pode ser descartado.

7. Pontos de Controle (Checkpoints)

Antes do EO:

- Viabilidade avaliada;
- Protocolo recebido;
- Cotação aprovada;
- Materiais disponíveis.

Antes da execução:

- Teste agendado;
- Reunião de alinhamento realizada.

Após EO:

- Resultado registrado;
- Decisão tomada (reteste ou PQ).

Antes do PQ:

- EO aprovado (quando aplicável);
- Materiais disponíveis;
- Cadastro técnico completo.

Após PQ:

- Relatório preenchido;
- Avaliação final concluída.

8. Observações Importantes

- EO pode variar conforme o tipo de projeto;
- Um mesmo protocolo pode conter múltiplos testes;
- O processo depende diretamente da Wella (solicitação e critérios);
- A reunião pré-teste deve ser considerada obrigatória para reduzir riscos.
